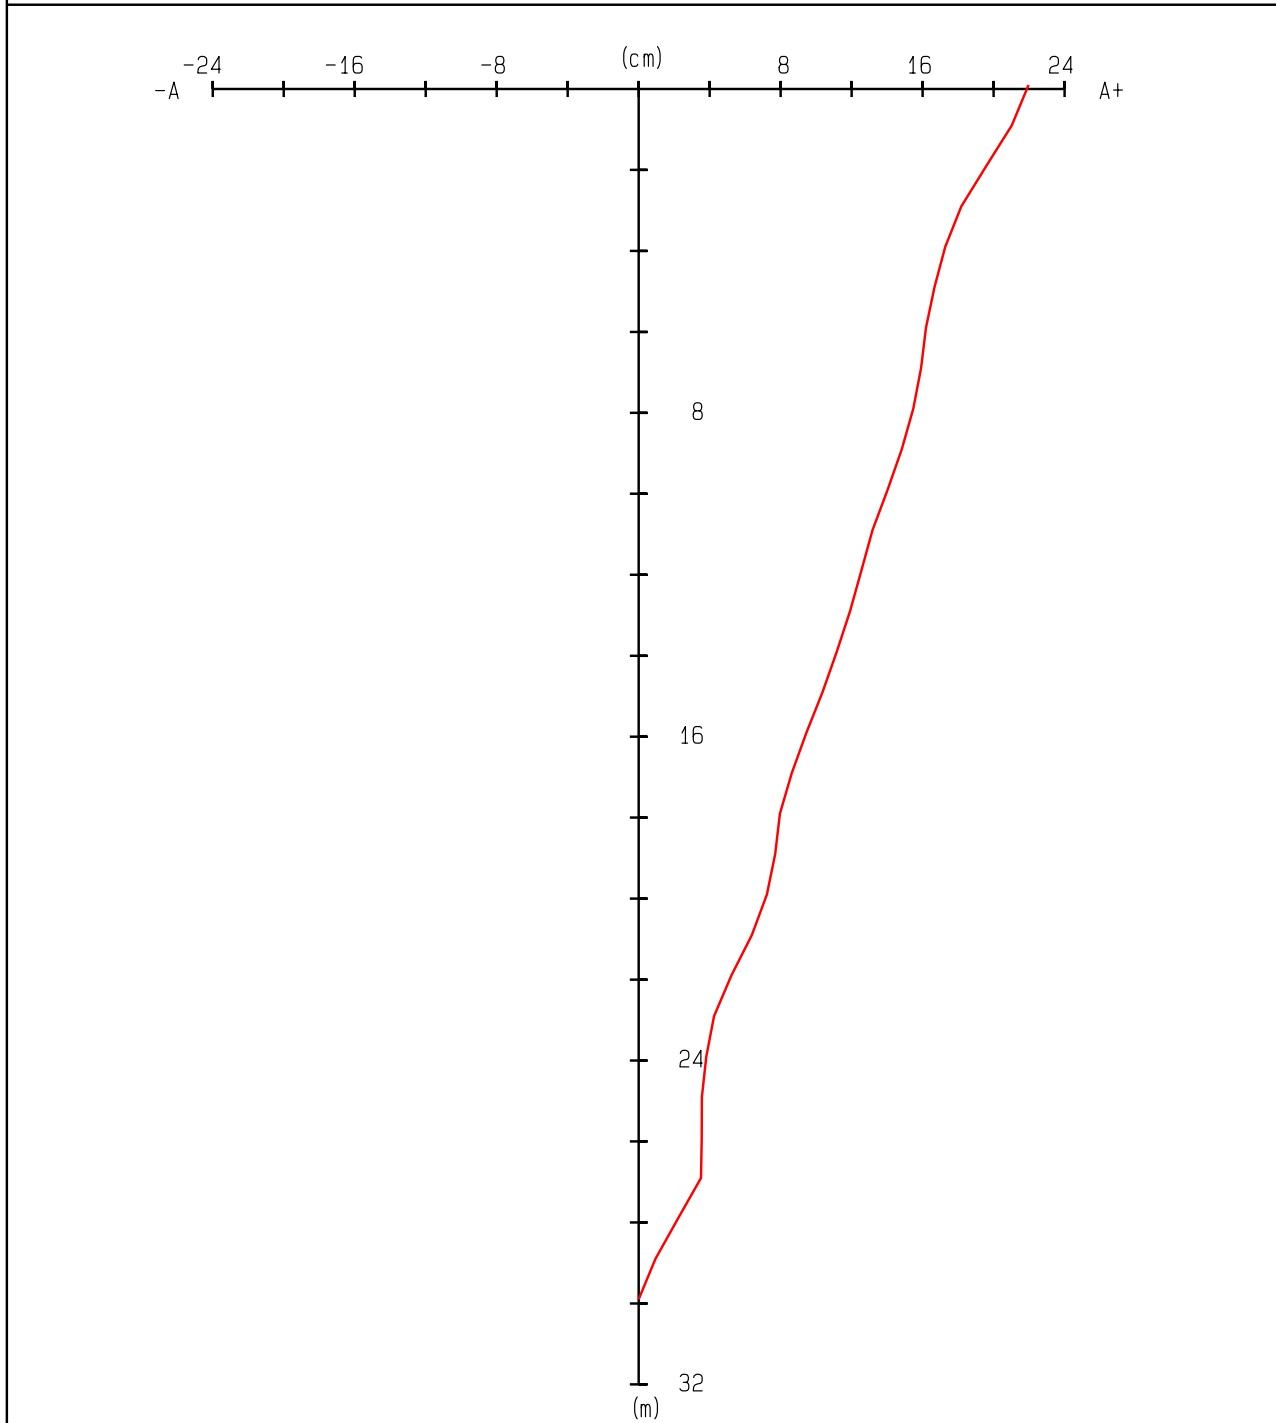

 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 274 Überstand über GOK [m]: 0.85
 Nummer der Bohrung: 3 Anzahl der Meßschritte: 30
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 13:20
 Nummer der Meßreihe: 0 Datum: 18.07.24
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 260°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL		AUSLENKUNG AUS		GESAMTAUSLENKUNG		ABWEICHUNG	
	TIEFE UNTER GOK		DER VERTIKALEN		REL.ZUM FIXPUNKT		NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
1.0	-0.10	0.90	0.9500	0.9000	21.9750	0.8700	-0.60	2.00
2.0	0.90	1.90	1.4350	0.3850	21.0250	-0.0300	-0.65	2.15
3.0	1.90	2.90	1.4100	-0.1250	19.5900	-0.4150	-0.60	2.15
4.0	2.90	3.90	0.9100	-0.3600	18.1800	-0.2900	-0.60	2.20
5.0	3.90	4.90	0.6050	-0.1700	17.2700	0.0700	-0.65	2.10
6.0	4.90	5.90	0.4750	0.0600	16.6650	0.2400	-0.65	2.00
7.0	5.90	6.90	0.2800	-0.2650	16.1900	0.1800	-0.60	2.25
8.0	6.90	7.90	0.4350	-0.1950	15.9100	0.4450	-0.65	2.05
9.0	7.90	8.90	0.6450	-0.0800	15.4750	0.6400	-0.65	2.10
10.0	8.90	9.90	0.8050	0.4950	14.8300	0.7200	-0.65	2.15
11.0	9.90	10.90	0.8550	0.5400	14.0250	0.2250	-0.65	2.10
12.0	10.90	11.90	0.6200	0.7050	13.1700	-0.3150	-0.60	2.15
13.0	11.90	12.90	0.6400	0.3950	12.5500	-1.0200	-0.70	2.15
14.0	12.90	13.90	0.7450	-0.3900	11.9100	-1.4150	-0.65	2.20
15.0	13.90	14.90	0.8100	-0.8750	11.1650	-1.0250	-0.60	2.15
16.0	14.90	15.90	0.9000	-0.6400	10.3550	-0.1500	-0.60	2.10
17.0	15.90	16.90	0.8250	-0.3250	9.4550	0.4900	-0.65	2.15
18.0	16.90	17.90	0.6700	0.0200	8.6300	0.8150	-0.60	2.10
19.0	17.90	18.90	0.2650	0.1650	7.9600	0.7950	-0.65	2.05
20.0	18.90	19.90	0.4750	0.3950	7.6950	0.6300	-0.65	2.15
21.0	19.90	20.90	0.8450	0.4900	7.2200	0.2350	-0.55	2.10
22.0	20.90	21.90	1.1500	0.2150	6.3750	-0.2550	-0.70	2.15
23.0	21.90	22.90	0.9750	0.1850	5.2250	-0.4700	-0.65	2.15
24.0	22.90	23.90	0.4350	0.1800	4.2500	-0.6550	-0.65	2.10
25.0	23.90	24.90	0.2500	0.1000	3.8150	-0.8350	-0.60	2.10
26.0	24.90	25.90	0.0150	0.1100	3.5650	-0.9350	-0.55	2.10
27.0	25.90	26.90	0.0400	0.0700	3.5500	-1.0450	-0.60	2.10
28.0	26.90	27.90	1.2900	-0.2950	3.5100	-1.1150	-0.60	2.15
29.0	27.90	28.90	1.2700	-0.3850	2.2200	-0.8200	-0.60	2.15
30.0	28.90	29.90	0.9500	-0.4350	0.9500	-0.4350	-0.60	2.15

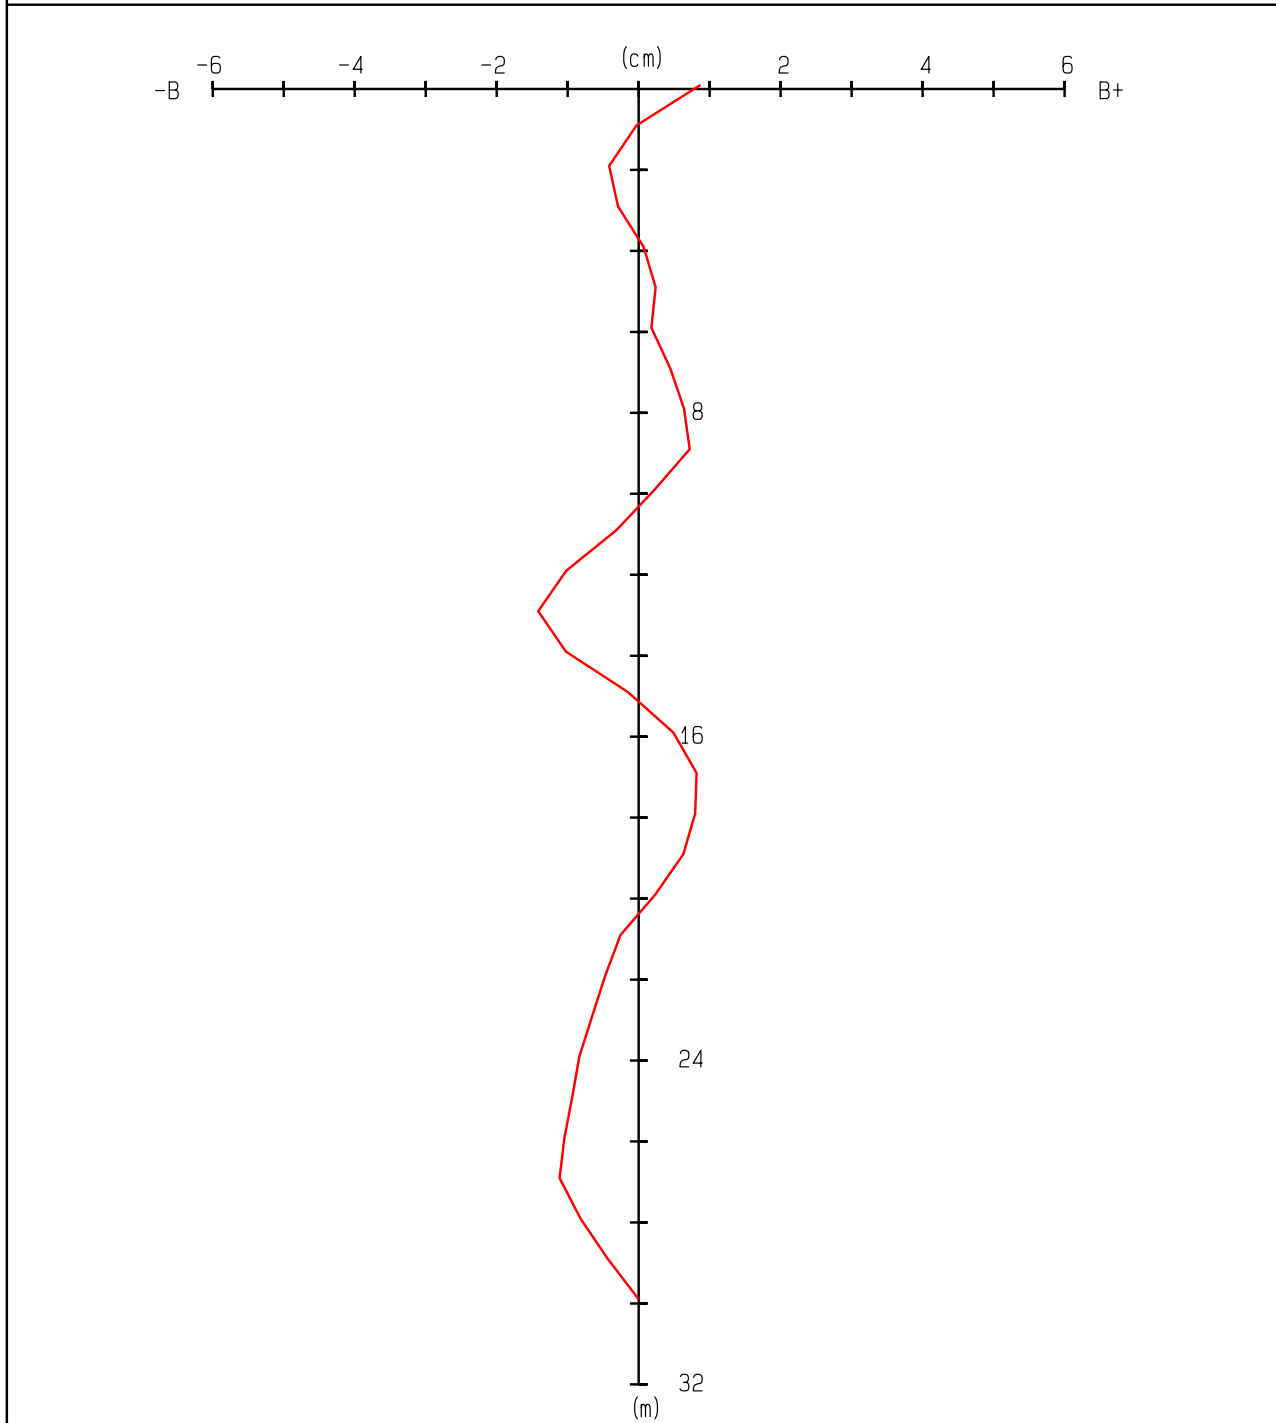
INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME: Strommasten Pfaender	MESSTELLE NR.: Mast 274
ABSOLUTER MESSSTRECKENVERLAUF:	
 MESSUNG: 0 vom: 18.07.24	



INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender	MESSTELLE NR.:	Mast 274
ABSOLUTER MESSSTRECKENVERLAUF:			
MESSUNG: 0 vom: 18.07.24			



INKLINOMETERMESSUNG

