
 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 272 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 1 Anzahl der Meßschritte: 29
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 12:56
 Nummer der Meßreihe: 2 Datum: 14.01.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 300°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL		AUSLENKUNG AUS		GESAMTAUSLENKUNG		ABWEICHUNG	
	TIEFE UNTER GOK		DER VERTIKALEN		REL.ZUM FIXPUNKT		NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
1.0	0.13	1.13	-0.9900	1.2050	28.6600	36.5250	-0.60	2.25
2.0	1.13	2.13	-0.4300	1.3050	29.6500	35.3200	-0.70	2.15
3.0	2.13	3.13	0.3450	2.0200	30.0800	34.0150	-0.65	2.20
4.0	3.13	4.13	0.4300	2.5200	29.7350	31.9950	-0.60	2.10
5.0	4.13	5.13	0.1200	2.2350	29.3050	29.4750	-0.60	2.15
6.0	5.13	6.13	0.8150	1.2900	29.1850	27.2400	-0.65	2.10
7.0	6.13	7.13	0.7500	0.6900	28.3700	25.9500	-0.70	2.20
8.0	7.13	8.13	0.7400	0.4050	27.6200	25.2600	-0.60	2.25
9.0	8.13	9.13	1.1300	0.2300	26.8800	24.8550	-0.60	1.90
10.0	9.13	10.13	1.3100	0.1100	25.7500	24.6250	-0.60	2.00
11.0	10.13	11.13	1.4800	0.1800	24.4400	24.5150	-0.60	2.10
12.0	11.13	12.13	1.0800	0.6450	22.9600	24.3350	-0.60	2.15
13.0	12.13	13.13	1.3400	1.2750	21.8800	23.6900	-0.60	2.15
14.0	13.13	14.13	1.7600	1.8150	20.5400	22.4150	-0.50	2.25
15.0	14.13	15.13	2.0650	2.3000	18.7800	20.6000	-0.65	2.10
16.0	15.13	16.13	1.9150	2.0450	16.7150	18.3000	-0.55	2.15
17.0	16.13	17.13	1.6300	1.8500	14.8000	16.2550	-0.60	2.20
18.0	17.13	18.13	1.2100	1.5850	13.1700	14.4050	-0.60	2.05
19.0	18.13	19.13	1.0350	1.4050	11.9600	12.8200	-0.65	2.15
20.0	19.13	20.13	1.1050	1.2050	10.9250	11.4150	-0.55	2.05
21.0	20.13	21.13	1.1300	1.1850	9.8200	10.2100	-0.60	2.15
22.0	21.13	22.13	1.1300	1.3900	8.6900	9.0250	-0.60	2.10
23.0	22.13	23.13	1.1750	1.6100	7.5600	7.6350	-0.65	2.10
24.0	23.13	24.13	1.4300	1.1750	6.3850	6.0250	-0.60	2.15
25.0	24.13	25.13	1.1900	0.9150	4.9550	4.8500	-0.60	2.15
26.0	25.13	26.13	0.6900	0.9550	3.7650	3.9350	-0.60	2.05
27.0	26.13	27.13	0.4650	0.7850	3.0750	2.9800	-0.65	2.15
28.0	27.13	28.13	1.0700	0.9400	2.6100	2.1950	-0.60	2.10
29.0	28.13	29.13	1.5400	1.2550	1.5400	1.2550	-0.60	2.15


 *NEIGUNGSMESSUNG ***** MEßREIHENVERGLEICH*

Projektname: Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 272 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 1 Anzahl der Meßschritte: 29
 Vergleichsmeßreihenr.: 0 Datum: 17.07.24
 Meßreihenr.: 2 Datum: 14.01.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 300°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK VON (m) BIS	DIFFERENZ ZUR MEßREIHE: 0 A (cm) B	BEWEGUNGS- RATE (mm/Tag)
1.0	0.13 1.13	0.2900 -0.0200	0.01602
2.0	1.13 2.13	0.2750 -0.0450	0.01519
3.0	2.13 3.13	0.2350 -0.0600	0.01298
4.0	3.13 4.13	0.2400 -0.0500	0.01326
5.0	4.13 5.13	0.2350 -0.0550	0.01298
6.0	5.13 6.13	0.1550 -0.0550	0.00856
7.0	6.13 7.13	0.1150 -0.0500	0.00635
8.0	7.13 8.13	0.1050 -0.0350	0.00580
9.0	8.13 9.13	0.0850 0.0050	0.00470
10.0	9.13 10.13	0.0650 -0.0000	0.00359
11.0	10.13 11.13	0.0500 0.0100	0.00276
12.0	11.13 12.13	0.0550 -0.0150	0.00304
13.0	12.13 13.13	0.0400 -0.0000	0.00221
14.0	13.13 14.13	0.0200 -0.0150	0.00110
15.0	14.13 15.13	-0.0200 -0.0450	0.00110
16.0	15.13 16.13	-0.0400 -0.0550	0.00221
17.0	16.13 17.13	-0.0400 -0.0500	0.00221
18.0	17.13 18.13	-0.0350 -0.0450	0.00193
19.0	18.13 19.13	-0.0250 -0.0350	0.00138
20.0	19.13 20.13	-0.0300 -0.0250	0.00166
21.0	20.13 21.13	-0.0350 -0.0150	0.00193
22.0	21.13 22.13	-0.0350 -0.0150	0.00193
23.0	22.13 23.13	-0.0400 -0.0150	0.00221
24.0	23.13 24.13	-0.0400 -0.0250	0.00221
25.0	24.13 25.13	-0.0500 -0.0150	0.00276
26.0	25.13 26.13	-0.0500 -0.0200	0.00276
27.0	26.13 27.13	-0.0550 -0.0250	0.00304
28.0	27.13 28.13	-0.0550 -0.0250	0.00304
29.0	28.13 29.13	-0.0650 -0.0250	0.00359

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME: Strommasten Pfaender	MESSSTELLE NR.: Mast 272
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUEGLICH DER MESSUNG: vom: 0 17.07.24	
MESSUNG: 2 vom: 14.01.25	MESSUNG: 1 vom: 30.10.24

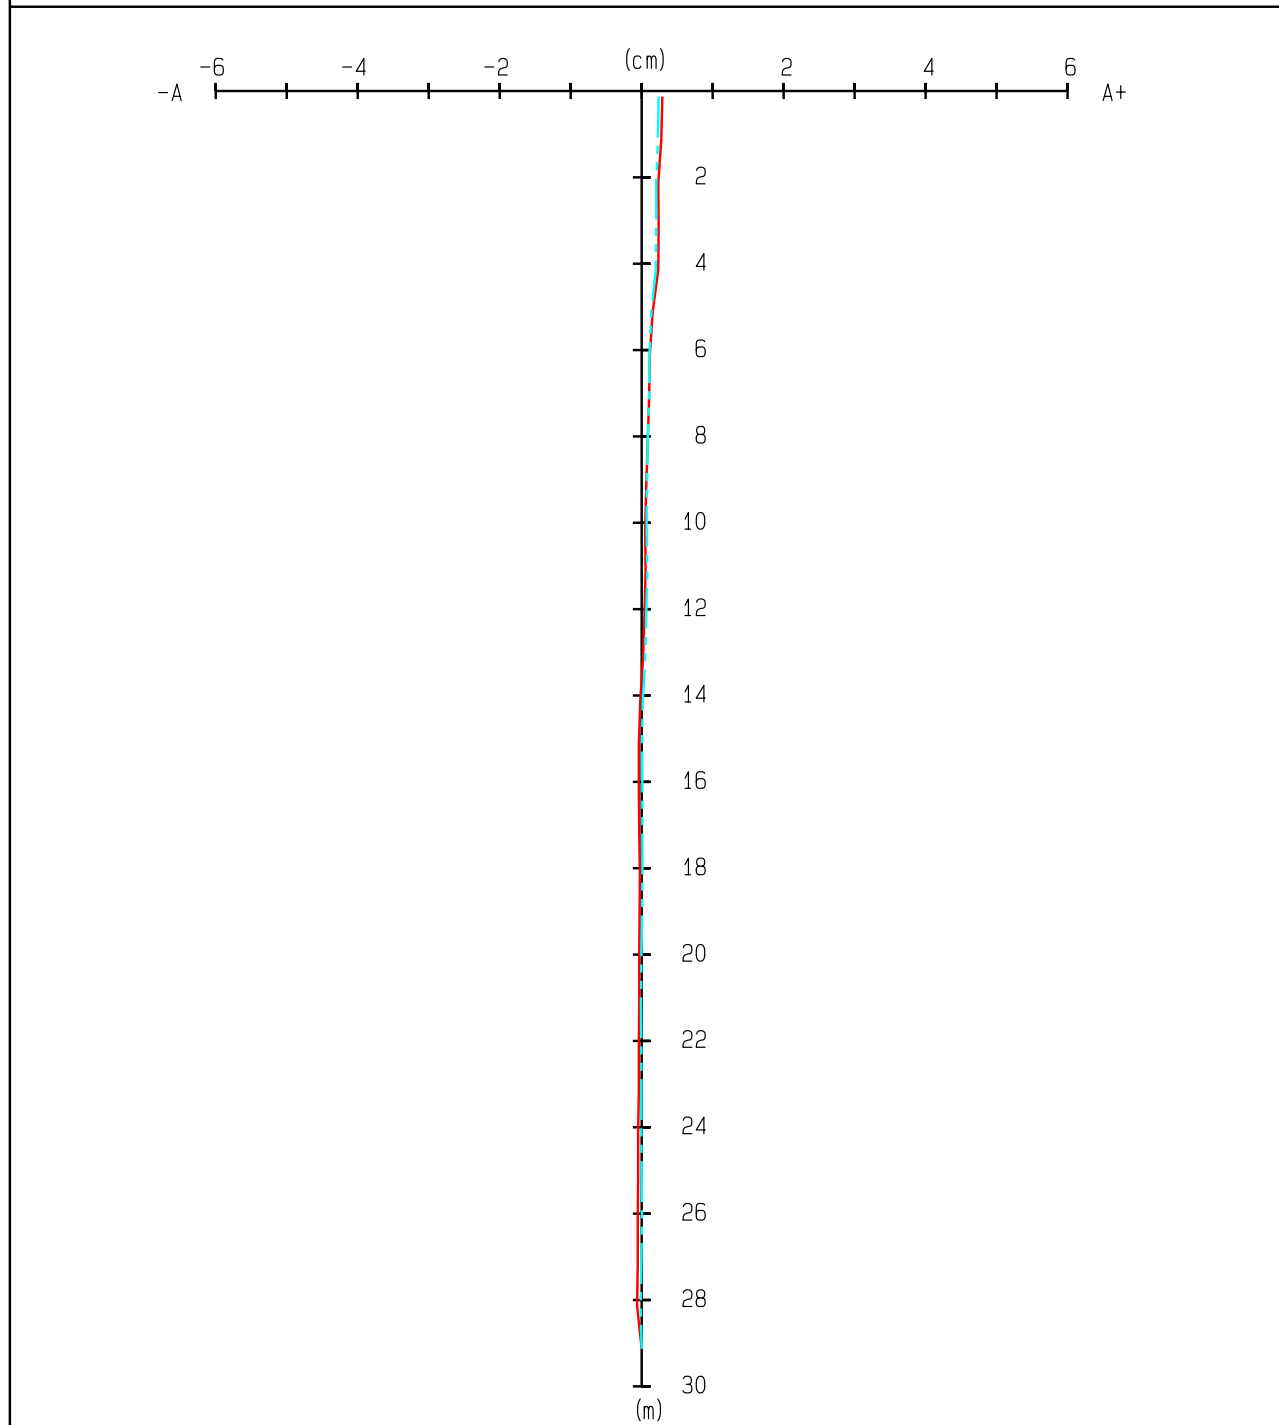

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME: Strommasten Pfaender	MESSSTELLE NR.: Mast 272
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUEGLICH DER MESSUNG:	vom: 0 17.07.24
MESSUNG: 2 vom: 14.01.25	MESSUNG: 1 vom: 30.10.24

