
 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 274 Überstand über GOK [m]: 0.85
 Nummer der Bohrung: 3 Anzahl der Meßschritte: 30
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 09:35
 Nummer der Meßreihe: 2 Datum: 15.01.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 260°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK		AUSLENKUNG AUS DER VERTIKALEN		GESAMTAUSLENKUNG REL.ZUM FIXPUNKT		ABWEICHUNG NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
1.0	-0.10	0.90	1.0050	0.9500	22.0350	1.0500	-0.65	2.00
2.0	0.90	1.90	1.4450	0.3750	21.0300	0.1000	-0.65	2.25
3.0	1.90	2.90	1.4100	-0.1050	19.5850	-0.2750	-0.70	2.05
4.0	2.90	3.90	0.9300	-0.3550	18.1750	-0.1700	-0.70	2.05
5.0	3.90	4.90	0.6300	-0.1600	17.2450	0.1850	-0.70	2.00
6.0	4.90	5.90	0.4850	0.0650	16.6150	0.3450	-0.65	1.95
7.0	5.90	6.90	0.2800	-0.2500	16.1300	0.2800	-0.70	2.00
8.0	6.90	7.90	0.4350	-0.1950	15.8500	0.5300	-0.65	1.95
9.0	7.90	8.90	0.6500	-0.0600	15.4150	0.7250	-0.70	2.00
10.0	8.90	9.90	0.8050	0.5100	14.7650	0.7850	-0.65	2.10
11.0	9.90	10.90	0.8450	0.5600	13.9600	0.2750	-0.65	2.10
12.0	10.90	11.90	0.6150	0.7200	13.1150	-0.2850	-0.65	2.10
13.0	11.90	12.90	0.6350	0.3900	12.5000	-1.0050	-0.65	2.20
14.0	12.90	13.90	0.7450	-0.3850	11.8650	-1.3950	-0.65	2.05
15.0	13.90	14.90	0.8100	-0.8800	11.1200	-1.0100	-0.60	2.00
16.0	14.90	15.90	0.9050	-0.6400	10.3100	-0.1300	-0.65	2.00
17.0	15.90	16.90	0.8200	-0.3150	9.4050	0.5100	-0.70	2.05
18.0	16.90	17.90	0.6550	0.0200	8.5850	0.8250	-0.65	2.00
19.0	17.90	18.90	0.2550	0.1750	7.9300	0.8050	-0.65	1.95
20.0	18.90	19.90	0.4700	0.4050	7.6750	0.6300	-0.70	2.05
21.0	19.90	20.90	0.8400	0.5050	7.2050	0.2250	-0.60	2.05
22.0	20.90	21.90	1.1500	0.2250	6.3650	-0.2800	-0.70	2.05
23.0	21.90	22.90	0.9700	0.1900	5.2150	-0.5050	-0.70	2.00
24.0	22.90	23.90	0.4350	0.1800	4.2450	-0.6950	-0.65	2.00
25.0	23.90	24.90	0.2450	0.0950	3.8100	-0.8750	-0.65	1.95
26.0	24.90	25.90	0.0150	0.0950	3.5650	-0.9700	-0.65	1.95
27.0	25.90	26.90	0.0350	0.0600	3.5500	-1.0650	-0.65	2.00
28.0	26.90	27.90	1.2800	-0.3000	3.5150	-1.1250	-0.70	2.00
29.0	27.90	28.90	1.2700	-0.3850	2.2350	-0.8250	-0.70	2.05
30.0	28.90	29.90	0.9650	-0.4400	0.9650	-0.4400	-0.65	2.00


 *NEIGUNGSMESSUNG ***** MEßREIHENVERGLEICH*

Projektname: Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 274 Überstand über GOK [m]: 0.85
 Nummer der Bohrung: 3 Anzahl der Meßschritte: 30
 Vergleichsmeßreihenr.: 0 Datum: 18.07.24
 Meßreihenr.: 2 Datum: 15.01.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 260°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK VON (m) BIS	DIFFERENZ ZUR MEßREIHE: 0 A (cm) B	BEWEGUNGS- RATE (mm/Tag)
1.0	-0.10 0.90	0.0600 0.1800	0.00331
2.0	0.90 1.90	0.0050 0.1300	0.00028
3.0	1.90 2.90	-0.0050 0.1400	0.00028
4.0	2.90 3.90	-0.0050 0.1200	0.00028
5.0	3.90 4.90	-0.0250 0.1150	0.00138
6.0	4.90 5.90	-0.0500 0.1050	0.00276
7.0	5.90 6.90	-0.0600 0.1000	0.00331
8.0	6.90 7.90	-0.0600 0.0850	0.00331
9.0	7.90 8.90	-0.0600 0.0850	0.00331
10.0	8.90 9.90	-0.0650 0.0650	0.00359
11.0	9.90 10.90	-0.0650 0.0500	0.00359
12.0	10.90 11.90	-0.0550 0.0300	0.00304
13.0	11.90 12.90	-0.0500 0.0150	0.00276
14.0	12.90 13.90	-0.0450 0.0200	0.00249
15.0	13.90 14.90	-0.0450 0.0150	0.00249
16.0	14.90 15.90	-0.0450 0.0200	0.00249
17.0	15.90 16.90	-0.0500 0.0200	0.00276
18.0	16.90 17.90	-0.0450 0.0100	0.00249
19.0	17.90 18.90	-0.0300 0.0100	0.00166
20.0	18.90 19.90	-0.0200 0.0000	0.00110
21.0	19.90 20.90	-0.0150 -0.0100	0.00083
22.0	20.90 21.90	-0.0100 -0.0250	0.00055
23.0	21.90 22.90	-0.0100 -0.0350	0.00055
24.0	22.90 23.90	-0.0050 -0.0400	0.00028
25.0	23.90 24.90	-0.0050 -0.0400	0.00028
26.0	24.90 25.90	0.0000 -0.0350	0.00000
27.0	25.90 26.90	0.0000 -0.0200	0.00000
28.0	26.90 27.90	0.0050 -0.0100	0.00028
29.0	27.90 28.90	0.0150 -0.0050	0.00083
30.0	28.90 29.90	0.0150 -0.0050	0.00083

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender		MESSTELLE NR.:	Mast 274	
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUEGLICH DER MESSUNG:	vom: 0		18.07.24		
—	MESSUNG: 2	vom: 15.01.25	---	MESSUNG: 1	vom: 31.10.24

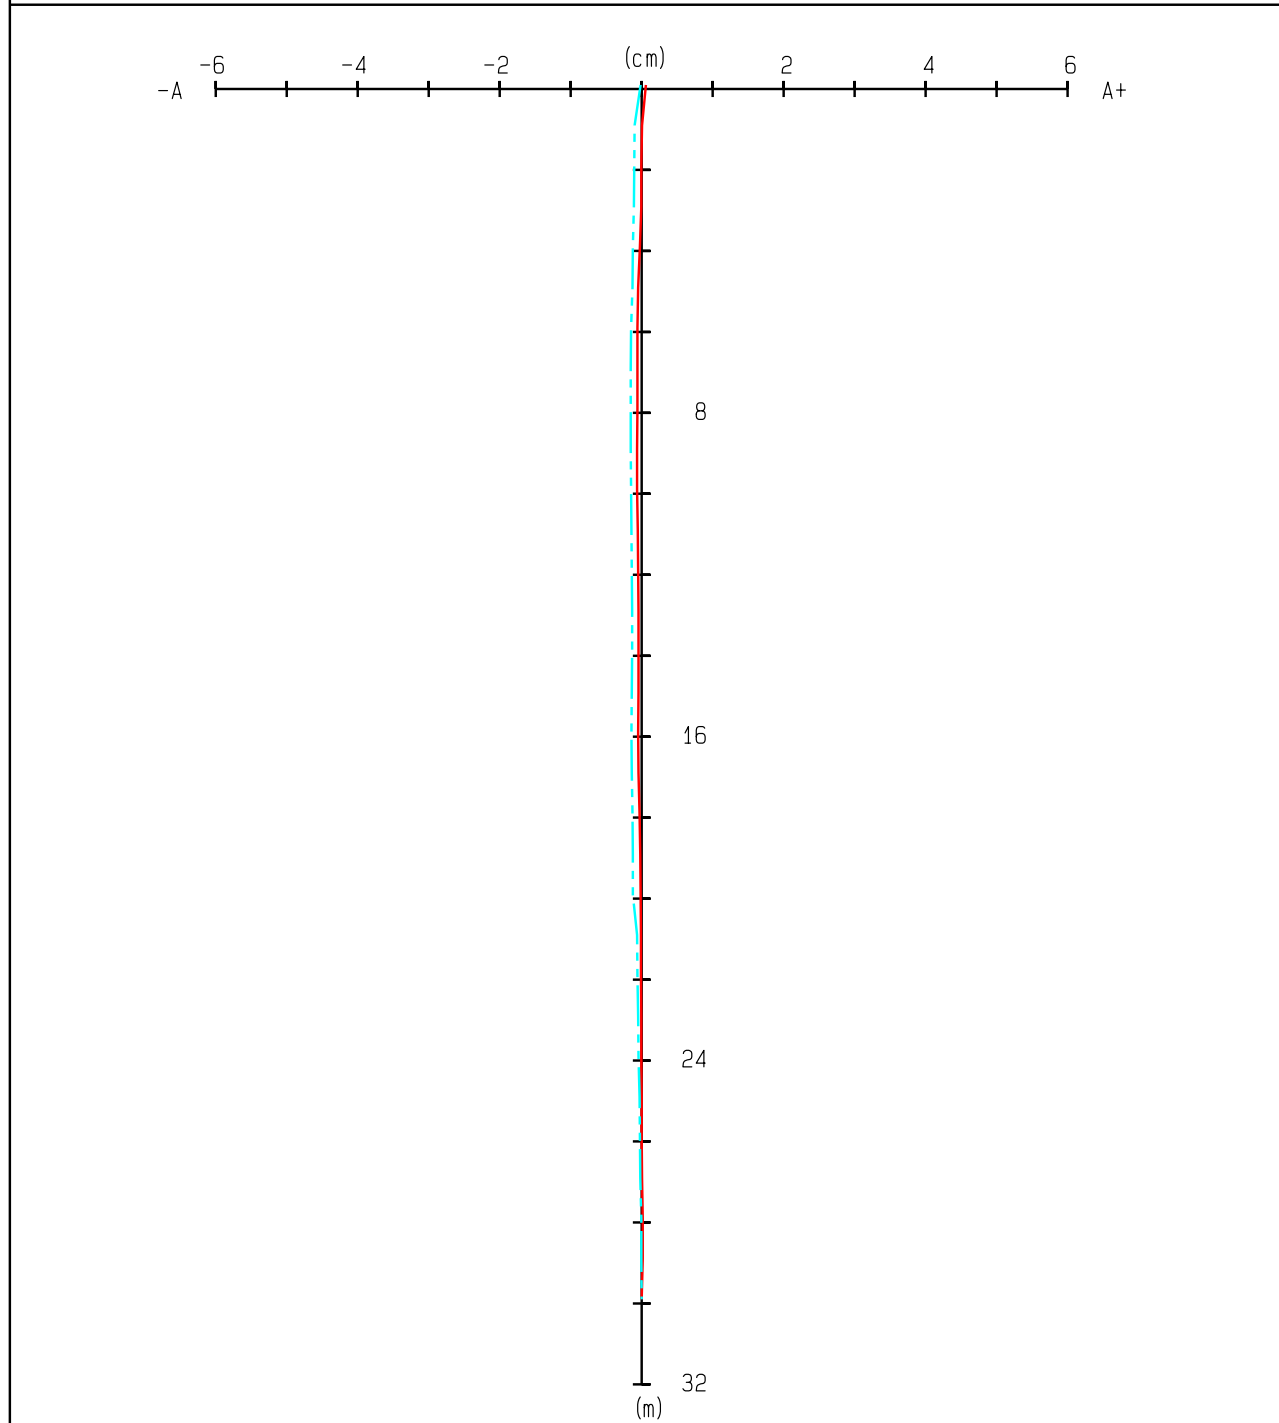

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender		MESSTELLE NR.:	Mast 274	
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUEGLICH DER MESSUNG:	vom: 0		18.07.24		
— MESSUNG: 2 vom: 15.01.25			- - - MESSUNG: 1 vom: 31.10.24		

