
 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 272 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 1 Anzahl der Meßschritte: 29
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 14:15
 Nummer der Meßreihe: 3 Datum: 15.04.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 300°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL		AUSLENKUNG AUS		GESAMTAUSLENKUNG		ABWEICHUNG	
	TIEFE UNTER GOK		DER VERTIKALEN		REL.ZUM FIXPUNKT		NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
1.0	0.13	1.13	-0.9900	1.1800	28.6300	36.4350	-0.60	2.00
2.0	1.13	2.13	-0.4250	1.3050	29.6200	35.2550	-0.75	1.85
3.0	2.13	3.13	0.3550	2.0400	30.0450	33.9500	-0.75	1.70
4.0	3.13	4.13	0.4300	2.5150	29.6900	31.9100	-0.70	1.85
5.0	4.13	5.13	0.1250	2.2350	29.2600	29.3950	-0.85	1.85
6.0	5.13	6.13	0.8100	1.2850	29.1350	27.1600	-0.80	1.85
7.0	6.13	7.13	0.7450	0.6900	28.3250	25.8750	-0.85	1.80
8.0	7.13	8.13	0.7400	0.4100	27.5800	25.1850	-0.90	2.00
9.0	8.13	9.13	1.1050	0.2500	26.8400	24.7750	-0.85	1.80
10.0	9.13	10.13	1.3100	0.0850	25.7350	24.5250	-0.80	1.55
11.0	10.13	11.13	1.4700	0.1800	24.4250	24.4400	-0.80	1.80
12.0	11.13	12.13	1.0800	0.6500	22.9550	24.2600	-0.80	1.80
13.0	12.13	13.13	1.3400	1.2750	21.8750	23.6100	-0.80	1.85
14.0	13.13	14.13	1.7650	1.8200	20.5350	22.3350	-1.15	1.90
15.0	14.13	15.13	2.0600	2.2800	18.7700	20.5150	-1.50	1.70
16.0	15.13	16.13	1.9000	2.0350	16.7100	18.2350	-0.80	1.85
17.0	16.13	17.13	1.6300	1.8400	14.8100	16.2000	-0.80	1.80
18.0	17.13	18.13	1.2050	1.5850	13.1800	14.3600	-0.75	1.85
19.0	18.13	19.13	1.0450	1.4000	11.9750	12.7750	-0.95	1.80
20.0	19.13	20.13	1.1100	1.2100	10.9300	11.3750	-0.80	1.80
21.0	20.13	21.13	1.1250	1.1850	9.8200	10.1650	-0.75	1.75
22.0	21.13	22.13	1.1300	1.3950	8.6950	8.9800	-0.80	1.85
23.0	22.13	23.13	1.1750	1.6000	7.5650	7.5850	-0.85	1.80
24.0	23.13	24.13	1.4300	1.1650	6.3900	5.9850	-0.80	1.85
25.0	24.13	25.13	1.1900	0.9100	4.9600	4.8200	-0.80	1.80
26.0	25.13	26.13	0.6850	0.9450	3.7700	3.9100	-0.75	1.85
27.0	26.13	27.13	0.4650	0.7750	3.0850	2.9650	-0.75	1.95
28.0	27.13	28.13	1.0750	0.9400	2.6200	2.1900	-0.75	1.90
29.0	28.13	29.13	1.5450	1.2500	1.5450	1.2500	-0.75	1.90


 *NEIGUNGSMESSUNG ***** MEßREIHENVERGLEICH*

Projektname: Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 272 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 1 Anzahl der Meßschritte: 29
 Vergleichsmeßreihenr.: 0 Datum: 17.07.24
 Meßreihenr.: 3 Datum: 15.04.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 300°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK VON (m) BIS	DIFFERENZ ZUR MEßREIHE: 0 A (cm) B	BEWEGUNGS- RATE (mm/Tag)
1.0	0.13 1.13	0.2600 -0.1100	0.00956
2.0	1.13 2.13	0.2450 -0.1100	0.00901
3.0	2.13 3.13	0.2000 -0.1250	0.00735
4.0	3.13 4.13	0.1950 -0.1350	0.00717
5.0	4.13 5.13	0.1900 -0.1350	0.00699
6.0	5.13 6.13	0.1050 -0.1350	0.00386
7.0	6.13 7.13	0.0700 -0.1250	0.00257
8.0	7.13 8.13	0.0650 -0.1100	0.00239
9.0	8.13 9.13	0.0450 -0.0750	0.00165
10.0	9.13 10.13	0.0500 -0.1000	0.00184
11.0	10.13 11.13	0.0350 -0.0650	0.00129
12.0	11.13 12.13	0.0500 -0.0900	0.00184
13.0	12.13 13.13	0.0350 -0.0800	0.00129
14.0	13.13 14.13	0.0150 -0.0950	0.00055
15.0	14.13 15.13	-0.0300 -0.1300	0.00110
16.0	15.13 16.13	-0.0450 -0.1200	0.00165
17.0	16.13 17.13	-0.0300 -0.1050	0.00110
18.0	17.13 18.13	-0.0250 -0.0900	0.00092
19.0	18.13 19.13	-0.0100 -0.0800	0.00037
20.0	19.13 20.13	-0.0250 -0.0650	0.00092
21.0	20.13 21.13	-0.0350 -0.0600	0.00129
22.0	21.13 22.13	-0.0300 -0.0600	0.00110
23.0	22.13 23.13	-0.0350 -0.0650	0.00129
24.0	23.13 24.13	-0.0350 -0.0650	0.00129
25.0	24.13 25.13	-0.0450 -0.0450	0.00165
26.0	25.13 26.13	-0.0450 -0.0450	0.00165
27.0	26.13 27.13	-0.0450 -0.0400	0.00165
28.0	27.13 28.13	-0.0450 -0.0300	0.00165
29.0	28.13 29.13	-0.0600 -0.0300	0.00221

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender		MESSTELLE NR.:	Mast 272	
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUEGLICH DER MESSUNG:	vom:	0		vom:	17.07.24
—	MESSUNG:	3	vom:	15.04.25	- - -
- - -	MESSUNG:	1	vom:	30.10.24	MESSUNG:
					2 vom: 14.01.25

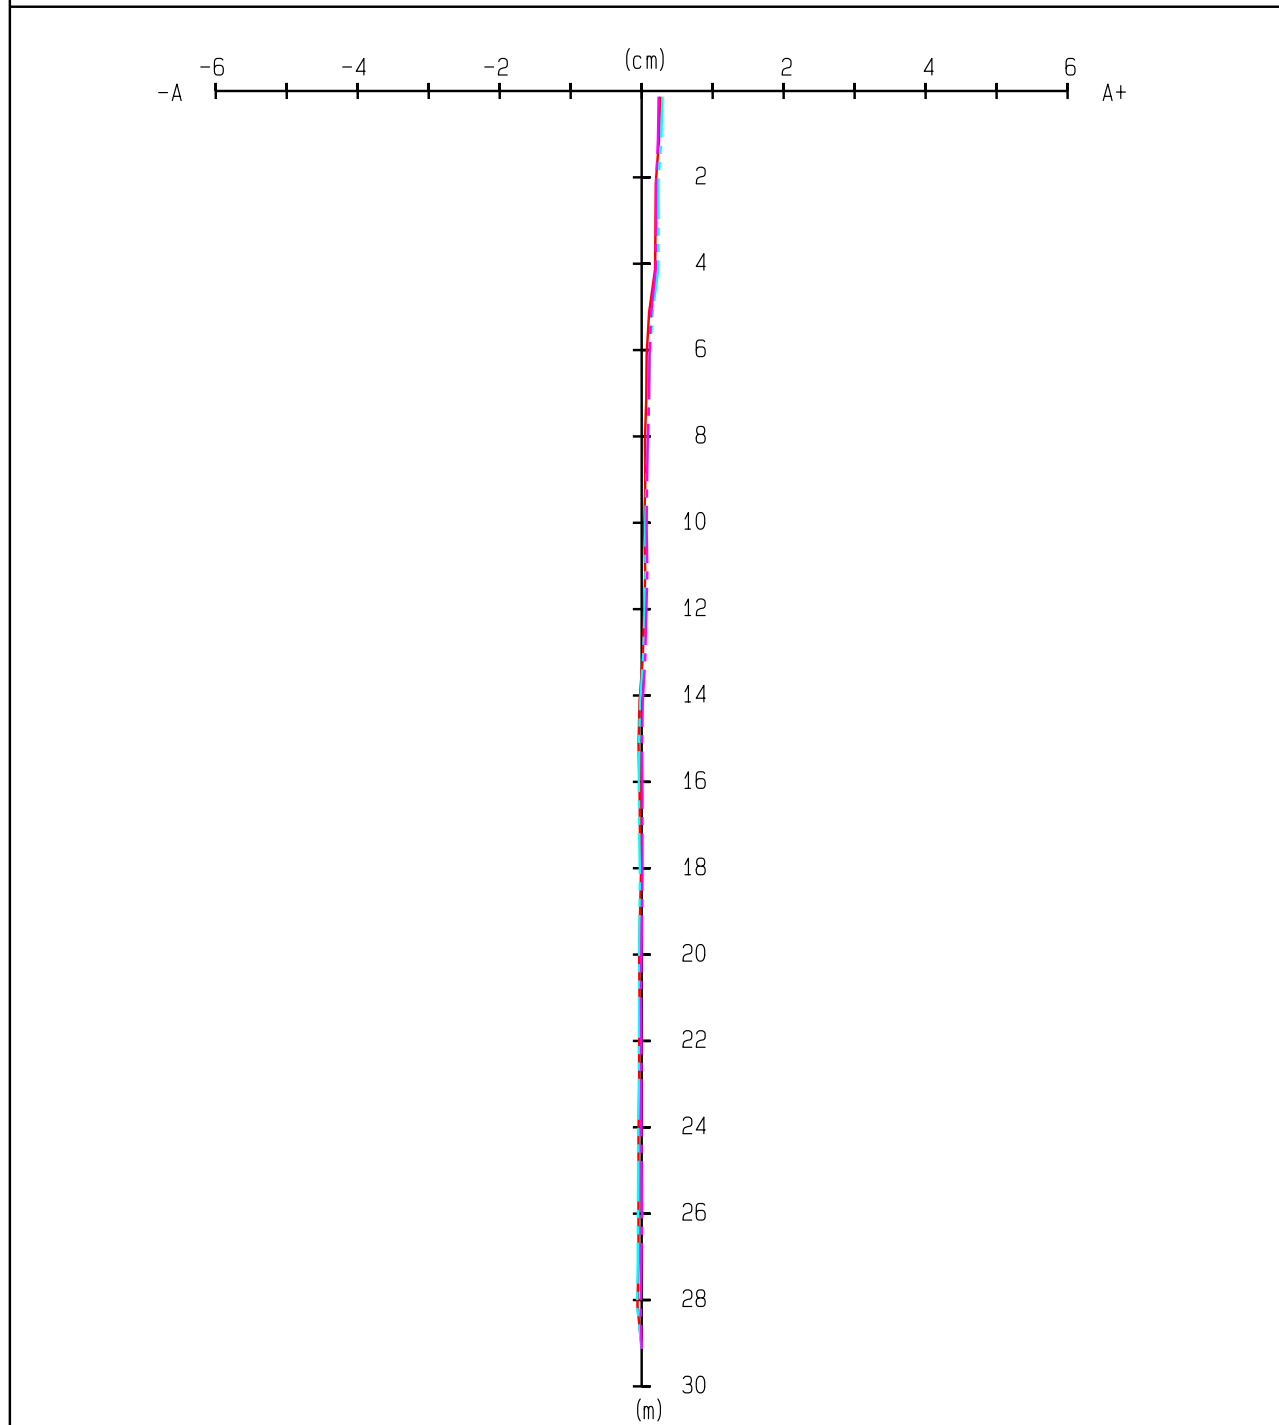

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender		MESSTELLE NR.:	Mast 272	
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUEGLICH DER MESSUNG:	vom: 0		17.07.24		
—	MESSUNG:	3	vom:	15.04.25	— — —
— — —	MESSUNG:	1	vom:	30.10.24	MESSUNG:
					2 vom: 14.01.25

