
 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 274 Überstand über GOK [m]: 0.85
 Nummer der Bohrung: 3 Anzahl der Meßschritte: 30
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 09:50
 Nummer der Meßreihe: 3 Datum: 16.04.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 260°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK		AUSLENKUNG AUS DER VERTIKALEN		GESAMTAUSLENKUNG REL.ZUM FIXPUNKT		ABWEICHUNG NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
1.0	-0.10	0.90	1.0550	0.9100	22.0400	0.9150	-1.25	1.70
2.0	0.90	1.90	1.4450	0.3750	20.9850	0.0050	-0.75	1.75
3.0	1.90	2.90	1.4000	-0.1300	19.5400	-0.3700	-0.70	1.60
4.0	2.90	3.90	0.9350	-0.3500	18.1400	-0.2400	-0.75	1.70
5.0	3.90	4.90	0.6300	-0.1700	17.2050	0.1100	-0.80	1.70
6.0	4.90	5.90	0.4900	0.0500	16.5750	0.2800	-0.80	1.60
7.0	5.90	6.90	0.2850	-0.2550	16.0850	0.2300	-0.75	1.65
8.0	6.90	7.90	0.4350	-0.1900	15.8000	0.4850	-0.75	1.70
9.0	7.90	8.90	0.6450	-0.0650	15.3650	0.6750	-0.75	1.75
10.0	8.90	9.90	0.8050	0.4900	14.7200	0.7400	-0.75	1.70
11.0	9.90	10.90	0.8450	0.5450	13.9150	0.2500	-0.75	1.75
12.0	10.90	11.90	0.6150	0.7050	13.0700	-0.2950	-0.75	1.65
13.0	11.90	12.90	0.6400	0.3950	12.4550	-1.0000	-0.80	1.75
14.0	12.90	13.90	0.7300	-0.3950	11.8150	-1.3950	-0.60	1.75
15.0	13.90	14.90	0.8050	-0.8750	11.0850	-1.0000	-0.75	1.75
16.0	14.90	15.90	0.9050	-0.6300	10.2800	-0.1250	-0.75	1.70
17.0	15.90	16.90	0.8200	-0.3150	9.3750	0.5050	-0.80	1.75
18.0	16.90	17.90	0.6550	0.0200	8.5550	0.8200	-0.75	1.70
19.0	17.90	18.90	0.2600	0.1650	7.9000	0.8000	-0.80	1.65
20.0	18.90	19.90	0.4750	0.3950	7.6400	0.6350	-0.75	1.75
21.0	19.90	20.90	0.8450	0.4900	7.1650	0.2400	-0.65	1.70
22.0	20.90	21.90	1.1400	0.2150	6.3200	-0.2500	-0.70	1.85
23.0	21.90	22.90	0.9700	0.1800	5.1800	-0.4650	-0.80	1.80
24.0	22.90	23.90	0.4400	0.1800	4.2100	-0.6450	-0.70	1.80
25.0	23.90	24.90	0.2450	0.1000	3.7700	-0.8250	-0.75	1.70
26.0	24.90	25.90	0.0050	0.1050	3.5250	-0.9250	-0.75	1.75
27.0	25.90	26.90	0.0300	0.0700	3.5200	-1.0300	-0.70	1.70
28.0	26.90	27.90	1.2650	-0.2950	3.4900	-1.1000	-0.75	1.65
29.0	27.90	28.90	1.2750	-0.3800	2.2250	-0.8050	-0.75	1.70
30.0	28.90	29.90	0.9500	-0.4250	0.9500	-0.4250	-0.90	1.75


 *NEIGUNGSMESSUNG ***** MEßREIHENVERGLEICH*

Projektname: Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 274 Überstand über GOK [m]: 0.85
 Nummer der Bohrung: 3 Anzahl der Meßschritte: 30
 Vergleichsmeßreihenr.: 0 Datum: 18.07.24
 Meßreihenr.: 3 Datum: 16.04.25
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 260°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK VON (m) BIS	DIFFERENZ ZUR MEßREIHE: 0 A (cm) B	BEWEGUNGS- RATE (mm/Tag)
1.0	-0.10 0.90	0.0650 0.0450	0.00239
2.0	0.90 1.90	-0.0400 0.0350	0.00147
3.0	1.90 2.90	-0.0500 0.0450	0.00184
4.0	2.90 3.90	-0.0400 0.0500	0.00147
5.0	3.90 4.90	-0.0650 0.0400	0.00239
6.0	4.90 5.90	-0.0900 0.0400	0.00331
7.0	5.90 6.90	-0.1050 0.0500	0.00386
8.0	6.90 7.90	-0.1100 0.0400	0.00404
9.0	7.90 8.90	-0.1100 0.0350	0.00404
10.0	8.90 9.90	-0.1100 0.0200	0.00404
11.0	9.90 10.90	-0.1100 0.0250	0.00404
12.0	10.90 11.90	-0.1000 0.0200	0.00368
13.0	11.90 12.90	-0.0950 0.0200	0.00349
14.0	12.90 13.90	-0.0950 0.0200	0.00349
15.0	13.90 14.90	-0.0800 0.0250	0.00294
16.0	14.90 15.90	-0.0750 0.0250	0.00276
17.0	15.90 16.90	-0.0800 0.0150	0.00294
18.0	16.90 17.90	-0.0750 0.0050	0.00276
19.0	17.90 18.90	-0.0600 0.0050	0.00221
20.0	18.90 19.90	-0.0550 0.0050	0.00202
21.0	19.90 20.90	-0.0550 0.0050	0.00202
22.0	20.90 21.90	-0.0550 0.0050	0.00202
23.0	21.90 22.90	-0.0450 0.0050	0.00165
24.0	22.90 23.90	-0.0400 0.0100	0.00147
25.0	23.90 24.90	-0.0450 0.0100	0.00165
26.0	24.90 25.90	-0.0400 0.0100	0.00147
27.0	25.90 26.90	-0.0300 0.0150	0.00110
28.0	26.90 27.90	-0.0200 0.0150	0.00074
29.0	27.90 28.90	0.0050 0.0150	0.00018
30.0	28.90 29.90	0.0000 0.0100	0.00000

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender		MESSTELLE NR.:	Mast 274	
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZÜGLICH DER MESSUNG:	vom: 0		18.07.24		
—	MESSUNG: 3	vom: 16.04.25	---	MESSUNG: 2	vom: 15.01.25
---	MESSUNG: 1	vom: 31.10.24			

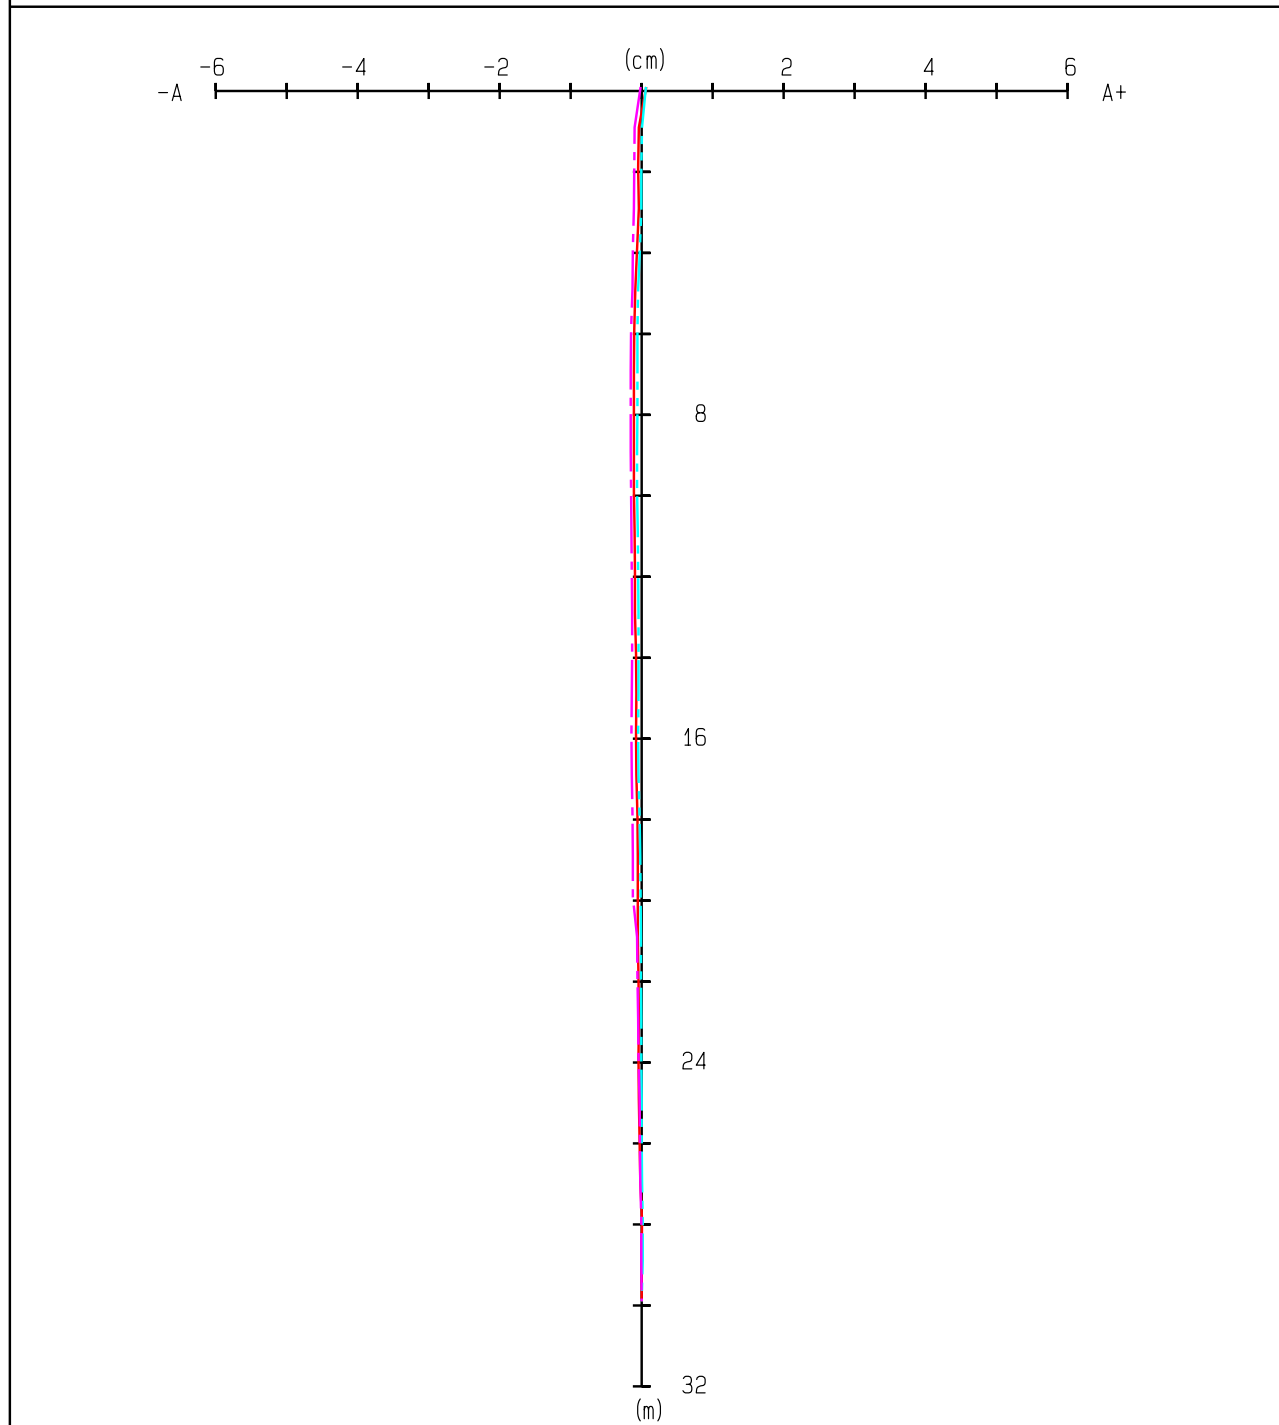

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender		MESSTELLE NR.:	Mast 274	
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUEGLICH DER MESSUNG:	vom: 0		18.07.24		
—	MESSUNG: 3	vom: 16.04.25	---	MESSUNG: 2	vom: 15.01.25
---	MESSUNG: 1	vom: 31.10.24			

