
 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 272 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 1 Anzahl der Meßschritte: 29
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 13:45
 Nummer der Meßreihe: 6 Datum: 20.01.26
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 300°
 Baugrund:


MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK		AUSLENKUNG AUS DER VERTIKALEN		GESAMTAUSLENKUNG REL.ZUM FIXPUNKT		ABWEICHUNG NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
1.0	0.13	1.13	-1.0250	1.1950	28.7600	36.6250	-0.65	1.65
2.0	1.13	2.13	-0.4250	1.3150	29.7850	35.4300	-0.65	1.65
3.0	2.13	3.13	0.3500	2.0200	30.2100	34.1150	-0.60	1.60
4.0	3.13	4.13	0.4350	2.5300	29.8600	32.0950	-0.65	1.60
5.0	4.13	5.13	0.3250	2.3000	29.4250	29.5650	-0.65	1.70
6.0	5.13	6.13	0.8350	1.2950	29.1000	27.2650	-0.65	1.65
7.0	6.13	7.13	0.7400	0.7000	28.2650	25.9700	-0.70	1.60
8.0	7.13	8.13	0.7350	0.4200	27.5250	25.2700	-0.75	1.90
9.0	8.13	9.13	1.1050	0.2450	26.7900	24.8500	-0.65	1.65
10.0	9.13	10.13	1.3050	0.1050	25.6850	24.6050	-0.65	1.55
11.0	10.13	11.13	1.4700	0.1850	24.3800	24.5000	-0.60	1.55
12.0	11.13	12.13	1.0800	0.6550	22.9100	24.3150	-0.70	1.75
13.0	12.13	13.13	1.3350	1.2750	21.8300	23.6600	-0.65	1.65
14.0	13.13	14.13	1.7600	1.8150	20.4950	22.3850	-0.60	1.75
15.0	14.13	15.13	2.0400	2.2900	18.7350	20.5700	-0.70	1.60
16.0	15.13	16.13	1.9000	2.0400	16.6950	18.2800	-0.60	1.60
17.0	16.13	17.13	1.6350	1.8450	14.7950	16.2400	-0.65	1.65
18.0	17.13	18.13	1.2050	1.5800	13.1600	14.3950	-0.55	1.70
19.0	18.13	19.13	1.0300	1.4000	11.9550	12.8150	-0.60	1.60
20.0	19.13	20.13	1.1050	1.2200	10.9250	11.4150	-0.65	1.70
21.0	20.13	21.13	1.1300	1.1850	9.8200	10.1950	-0.60	1.65
22.0	21.13	22.13	1.1350	1.3950	8.6900	9.0100	-0.65	1.65
23.0	22.13	23.13	1.1750	1.6050	7.5550	7.6150	-0.65	1.65
24.0	23.13	24.13	1.4300	1.1800	6.3800	6.0100	-0.60	1.70
25.0	24.13	25.13	1.1950	0.9100	4.9500	4.8300	-0.65	1.70
26.0	25.13	26.13	0.6900	0.9550	3.7550	3.9200	-0.60	1.65
27.0	26.13	27.13	0.4650	0.7800	3.0650	2.9650	-0.65	1.70
28.0	27.13	28.13	1.0600	0.9350	2.6000	2.1850	-0.60	1.75
29.0	28.13	29.13	1.5400	1.2500	1.5400	1.2500	-0.60	1.70

 *NEIGUNGSMESSUNG ***** MEßREIHENVERGLEICH*

Projektname: Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 272 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 1 Anzahl der Meßschritte: 29
 Vergleichsmeßreihenr.: 0 Datum: 17.07.24
 Meßreihenr.: 6 Datum: 20.01.26
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 300°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK VON (m) BIS	DIFFERENZ ZUR MEßREIHE: 0 A (cm) B	BEWEGUNGS- RATE (mm/Tag)
1.0	0.13 1.13	0.3900 0.0800	0.00707
2.0	1.13 2.13	0.4100 0.0650	0.00743
3.0	2.13 3.13	0.3650 0.0400	0.00661
4.0	3.13 4.13	0.3650 0.0500	0.00661
5.0	4.13 5.13	0.3550 0.0350	0.00643
6.0	5.13 6.13	0.0700 -0.0300	0.00127
7.0	6.13 7.13	0.0100 -0.0300	0.00018
8.0	7.13 8.13	0.0100 -0.0250	0.00018
9.0	8.13 9.13	-0.0050 -0.0000	0.00009
10.0	9.13 10.13	-0.0000 -0.0200	0.00000
11.0	10.13 11.13	-0.0100 -0.0050	0.00018
12.0	11.13 12.13	0.0050 -0.0350	0.00009
13.0	12.13 13.13	-0.0100 -0.0300	0.00018
14.0	13.13 14.13	-0.0250 -0.0450	0.00045
15.0	14.13 15.13	-0.0650 -0.0750	0.00118
16.0	15.13 16.13	-0.0600 -0.0750	0.00109
17.0	16.13 17.13	-0.0450 -0.0650	0.00082
18.0	17.13 18.13	-0.0450 -0.0550	0.00082
19.0	18.13 19.13	-0.0300 -0.0400	0.00054
20.0	19.13 20.13	-0.0300 -0.0250	0.00054
21.0	20.13 21.13	-0.0350 -0.0300	0.00063
22.0	21.13 22.13	-0.0350 -0.0300	0.00063
23.0	22.13 23.13	-0.0450 -0.0350	0.00082
24.0	23.13 24.13	-0.0450 -0.0400	0.00082
25.0	24.13 25.13	-0.0550 -0.0350	0.00100
26.0	25.13 26.13	-0.0600 -0.0350	0.00109
27.0	26.13 27.13	-0.0650 -0.0400	0.00118
28.0	27.13 28.13	-0.0650 -0.0350	0.00118
29.0	28.13 29.13	-0.0650 -0.0300	0.00118

INKLINOMETERMESSUNG

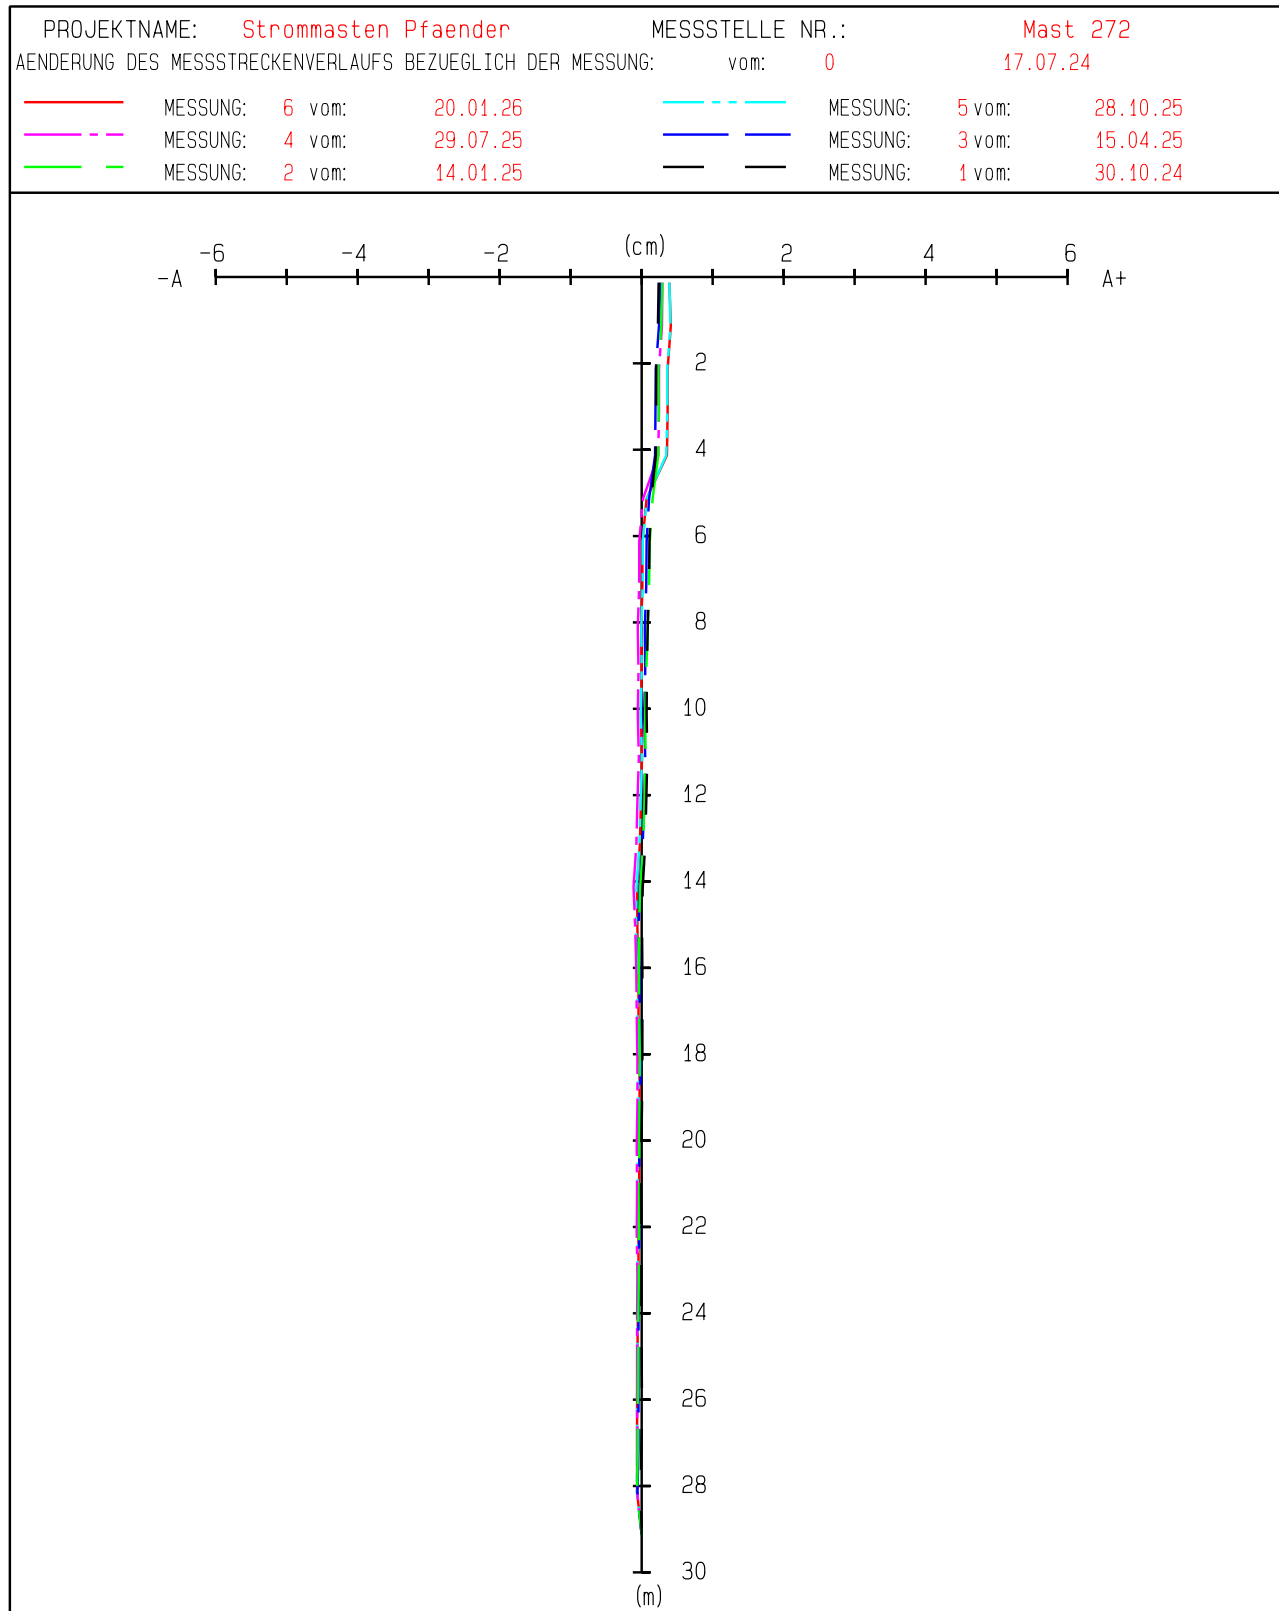

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender	MESSTELLE NR.:	Mast 272
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUGLICH DER MESSUNG:	vom: 0		17.07.24
—	MESSUNG: 6 vom: 20.01.26	- - -	MESSUNG: 5 vom: 28.10.25
- - -	MESSUNG: 4 vom: 29.07.25	—	MESSUNG: 3 vom: 15.04.25
- - -	MESSUNG: 2 vom: 14.01.25	—	MESSUNG: 1 vom: 30.10.24

