
 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 273 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 2 Anzahl der Meßschritte: 28
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 14:31
 Nummer der Meßreihe: 6 Datum: 20.01.26
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 280°
 Baugrund:


MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL		AUSLENKUNG AUS		GESAMTAUSLENKUNG		ABWEICHUNG	
	TIEFE UNTER GOK		DER VERTIKALEN		REL.ZUM FIXPUNKT		NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
1.0	0.13	1.13	-0.2850	1.5300	-1.4950	36.4900	-0.55	1.50
2.0	1.13	2.13	-0.4800	0.9850	-1.2100	34.9600	-0.60	1.65
3.0	2.13	3.13	-0.2150	0.8800	-0.7300	33.9750	-0.65	1.70
4.0	3.13	4.13	-0.2800	1.0350	-0.5150	33.0950	-0.80	1.65
5.0	4.13	5.13	1.5300	1.3400	-0.2350	32.0600	-0.60	1.60
6.0	5.13	6.13	-0.0150	0.8350	-1.7650	30.7200	-0.55	1.65
7.0	6.13	7.13	-0.0950	0.8750	-1.7500	29.8850	-0.65	1.65
8.0	7.13	8.13	0.2450	1.4250	-1.6550	29.0100	-0.55	1.65
9.0	8.13	9.13	0.1400	1.6000	-1.9000	27.5850	-0.60	1.60
10.0	9.13	10.13	0.2250	1.6750	-2.0400	25.9850	-0.65	1.65
11.0	10.13	11.13	-0.1600	1.9150	-2.2650	24.3100	-0.60	1.65
12.0	11.13	12.13	-0.4050	1.7700	-2.1050	22.3950	-0.65	1.60
13.0	12.13	13.13	-0.5150	1.6150	-1.7000	20.6250	-0.65	1.65
14.0	13.13	14.13	-0.5600	1.5150	-1.1850	19.0100	-0.60	1.65
15.0	14.13	15.13	-0.4600	1.3900	-0.6250	17.4950	-0.60	1.60
16.0	15.13	16.13	-0.5100	1.2200	-0.1650	16.1050	-0.60	1.70
17.0	16.13	17.13	0.1150	0.9550	0.3450	14.8850	-0.55	1.65
18.0	17.13	18.13	0.3650	0.8700	0.2300	13.9300	-0.65	1.70
19.0	18.13	19.13	0.6750	0.8150	-0.1350	13.0600	-0.55	1.65
20.0	19.13	20.13	0.3550	0.8800	-0.8100	12.2450	-0.55	1.60
21.0	20.13	21.13	-0.1100	1.2850	-1.1650	11.3650	-0.60	1.65
22.0	21.13	22.13	-0.6100	1.6750	-1.0550	10.0800	-0.60	1.65
23.0	22.13	23.13	-0.5250	2.0700	-0.4450	8.4050	-0.65	1.70
24.0	23.13	24.13	-0.3100	1.4400	0.0800	6.3350	-0.60	1.70
25.0	24.13	25.13	0.1200	1.0000	0.3900	4.8950	-0.60	1.70
26.0	25.13	26.13	0.2100	1.2250	0.2700	3.8950	-0.60	1.65
27.0	26.13	27.13	0.0900	1.3750	0.0600	2.6700	-0.60	1.65
28.0	27.13	28.13	-0.0300	1.2950	-0.0300	1.2950	-0.70	1.55

 *NEIGUNGSMESSUNG ***** MEßREIHENVERGLEICH*

Projektname: Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 273 Überstand über GOK [m]: 0.62
 Nummer der Bohrung: 2 Anzahl der Meßschritte: 28
 Vergleichsmeßreihenr.: 0 Datum: 18.07.24
 Meßreihenr.: 6 Datum: 20.01.26
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 280°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK VON (m) BIS	DIFFERENZ ZUR MEßREIHE: 0 A (cm) B	BEWEGUNGS- RATE (mm/Tag)
1.0	0.13 1.13	1.3800 0.3300	0.02505
2.0	1.13 2.13	1.5150 0.3400	0.02750
3.0	2.13 3.13	1.5650 0.3150	0.02840
4.0	3.13 4.13	1.5650 0.3250	0.02840
5.0	4.13 5.13	1.5650 0.3200	0.02840
6.0	5.13 6.13	0.1200 0.2000	0.00218
7.0	6.13 7.13	0.0600 0.1900	0.00109
8.0	7.13 8.13	0.0550 0.1900	0.00100
9.0	8.13 9.13	0.0550 0.1800	0.00100
10.0	9.13 10.13	0.0550 0.1700	0.00100
11.0	10.13 11.13	0.0650 0.1800	0.00118
12.0	11.13 12.13	0.0850 0.1800	0.00154
13.0	12.13 13.13	0.1000 0.1800	0.00181
14.0	13.13 14.13	0.1050 0.1750	0.00191
15.0	14.13 15.13	0.1150 0.1800	0.00209
16.0	15.13 16.13	0.1200 0.1750	0.00218
17.0	16.13 17.13	0.1000 0.1850	0.00181
18.0	17.13 18.13	0.1000 0.1750	0.00181
19.0	18.13 19.13	0.0900 0.1750	0.00163
20.0	19.13 20.13	0.0900 0.1750	0.00163
21.0	20.13 21.13	0.0950 0.1750	0.00172
22.0	21.13 22.13	0.1050 0.1650	0.00191
23.0	22.13 23.13	0.1150 0.1650	0.00209
24.0	23.13 24.13	0.1150 0.1600	0.00209
25.0	24.13 25.13	0.1150 0.1650	0.00209
26.0	25.13 26.13	0.1200 0.1450	0.00218
27.0	26.13 27.13	0.1050 0.1350	0.00191
28.0	27.13 28.13	0.0750 0.1200	0.00136

INKLINOMETERMESSUNG

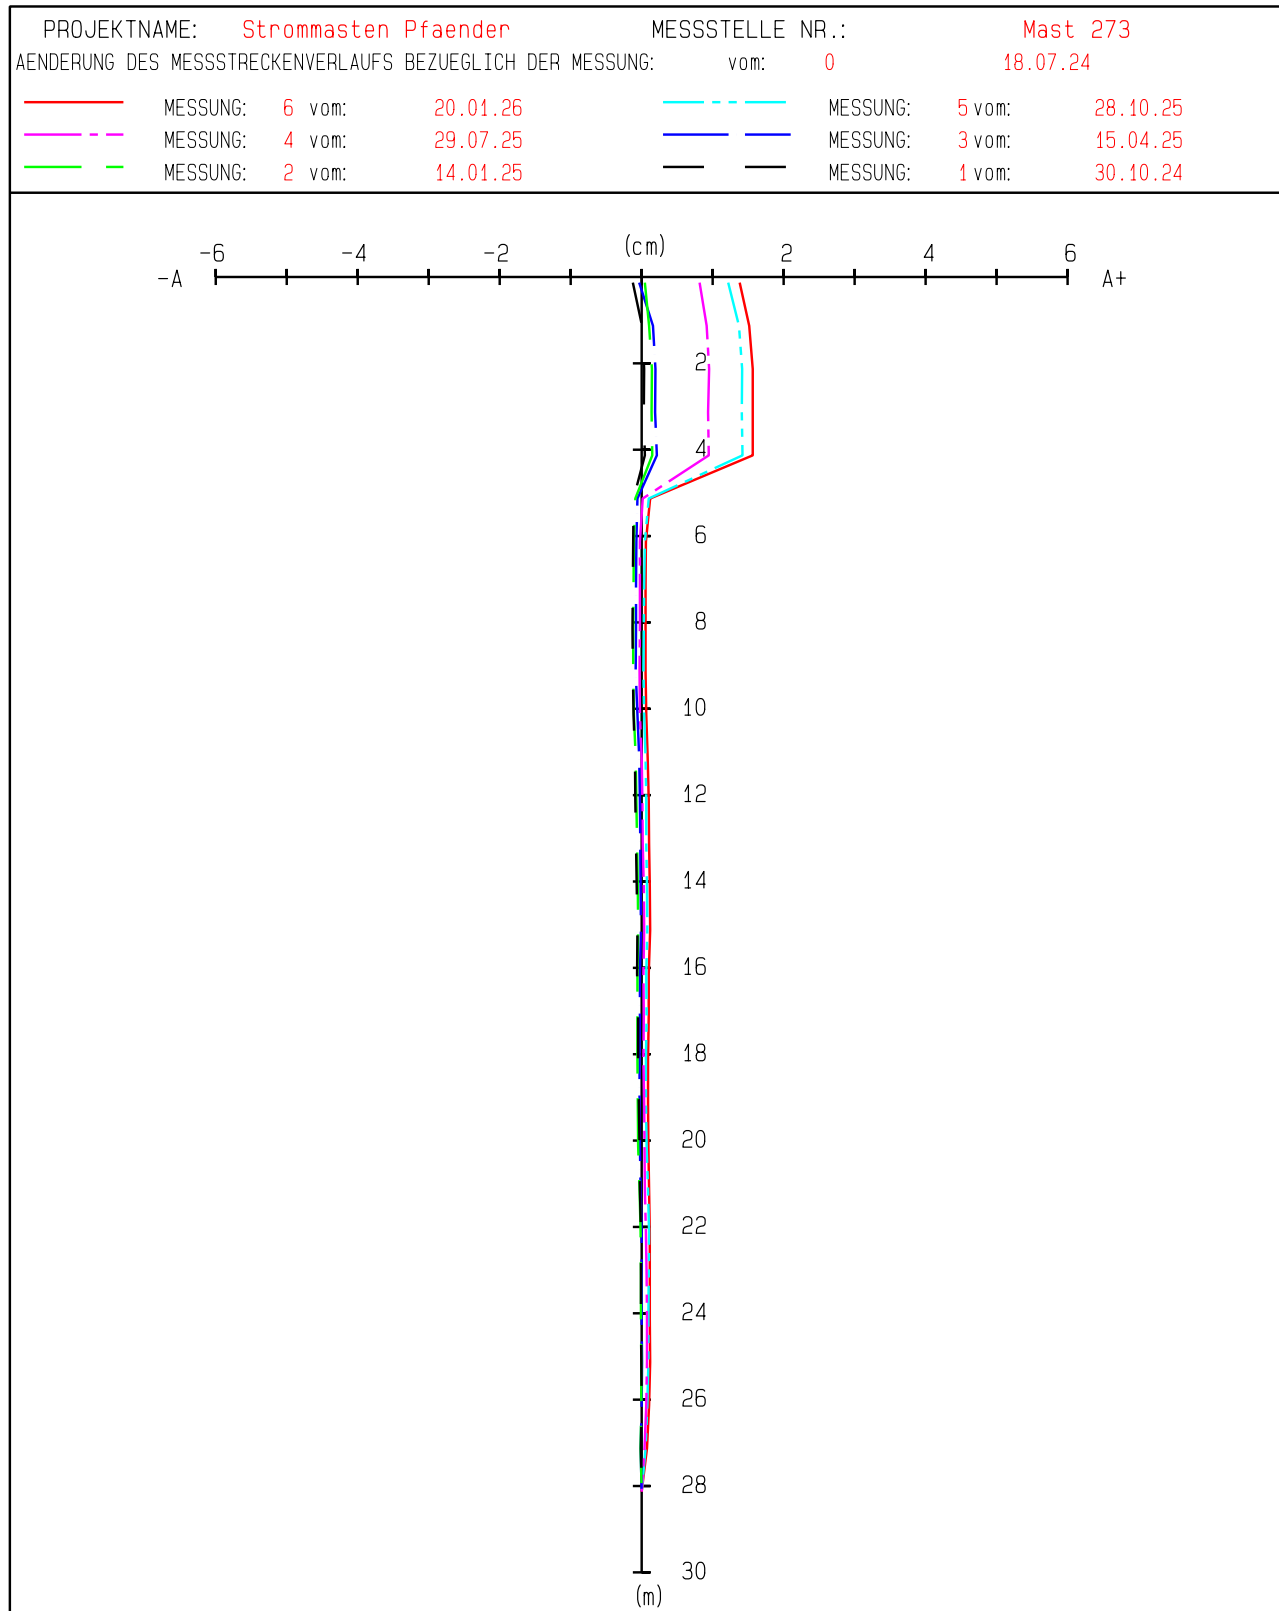

INKLINOMETERMESSUNG

PROJEKTNAME:	Strommasten Pfaender	MESSTELLE NR.:	Mast 273
ÄNDERUNG DES MESSSTRECKENVERLAUFS BEZUGLICH DER MESSUNG:	vom: 0		18.07.24
—	MESSUNG: 6 vom: 20.01.26	- - -	MESSUNG: 5 vom: 28.10.25
- - -	MESSUNG: 4 vom: 29.07.25	—	MESSUNG: 3 vom: 15.04.25
- - -	MESSUNG: 2 vom: 14.01.25	—	MESSUNG: 1 vom: 30.10.24

