
 *NEIGUNGSMESSUNG ***** ABS.VERLAUF DER MEßSTRECKE*

Projektname : Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 274 Überstand über GOK [m]: 0.85
 Nummer der Bohrung: 3 Anzahl der Meßschritte: 30
 Nullmessung: 0 Uhrzeit: 10:22
 Nummer der Meßreihe: 6 Datum: 21.01.26
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 260°
 Baugrund:


MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL		AUSLENKUNG AUS		GESAMTAUSLENKUNG		ABWEICHUNG	
	TIEFE UNTER GOK		DER VERTIKALEN		REL.ZUM FIXPUNKT		NULLAGE	
	VON (m)	BIS	A (cm)	B	A (cm)	B	A (mm)	B
1.0	-0.10	0.90	1.0700	0.9500	22.4000	0.9150	-0.70	1.50
2.0	0.90	1.90	1.4500	0.3650	21.3300	-0.0350	-0.70	1.65
3.0	1.90	2.90	1.4100	-0.1300	19.8800	-0.4000	-0.70	1.50
4.0	2.90	3.90	0.9400	-0.3500	18.4700	-0.2700	-0.70	1.70
5.0	3.90	4.90	0.7450	-0.1900	17.5300	0.0800	-0.75	1.60
6.0	4.90	5.90	0.6400	0.0350	16.7850	0.2700	-0.70	1.55
7.0	5.90	6.90	0.2750	-0.2450	16.1450	0.2350	-0.65	1.55
8.0	6.90	7.90	0.4350	-0.1900	15.8700	0.4800	-0.75	1.60
9.0	7.90	8.90	0.6450	-0.0800	15.4350	0.6700	-0.75	1.40
10.0	8.90	9.90	0.8000	0.4950	14.7900	0.7500	-0.80	1.55
11.0	9.90	10.90	0.8450	0.5450	13.9900	0.2550	-0.65	1.55
12.0	10.90	11.90	0.6100	0.7050	13.1450	-0.2900	-0.70	1.55
13.0	11.90	12.90	0.6400	0.3950	12.5350	-0.9950	-0.70	1.65
14.0	12.90	13.90	0.7450	-0.3900	11.8950	-1.3900	-0.75	1.60
15.0	13.90	14.90	0.8100	-0.8650	11.1500	-1.0000	-0.70	1.55
16.0	14.90	15.90	0.9100	-0.6400	10.3400	-0.1350	-0.70	1.60
17.0	15.90	16.90	0.8200	-0.3200	9.4300	0.5050	-0.70	1.60
18.0	16.90	17.90	0.6650	0.0250	8.6100	0.8250	-0.65	1.55
19.0	17.90	18.90	0.2600	0.1550	7.9450	0.8000	-0.70	1.55
20.0	18.90	19.90	0.4750	0.3950	7.6850	0.6450	-0.75	1.55
21.0	19.90	20.90	0.8500	0.4900	7.2100	0.2500	-0.60	1.50
22.0	20.90	21.90	1.1450	0.2250	6.3600	-0.2400	-0.65	1.65
23.0	21.90	22.90	0.9800	0.1800	5.2150	-0.4650	-0.70	1.60
24.0	22.90	23.90	0.4450	0.1800	4.2350	-0.6450	-0.65	1.70
25.0	23.90	24.90	0.2450	0.0700	3.7900	-0.8250	-0.65	1.80
26.0	24.90	25.90	0.0150	0.1150	3.5450	-0.8950	-0.65	1.55
27.0	25.90	26.90	0.0250	0.0700	3.5300	-1.0100	-0.65	1.60
28.0	26.90	27.90	1.2550	-0.2900	3.5050	-1.0800	-0.75	1.60
29.0	27.90	28.90	1.2800	-0.3750	2.2500	-0.7900	-0.60	1.65
30.0	28.90	29.90	0.9700	-0.4150	0.9700	-0.4150	-0.90	1.65

 *NEIGUNGSMESSUNG ***** MEßREIHENVERGLEICH*

Projektname: Strommasten Pfaender
 Name der Bohrung: Mast 274 Überstand über GOK [m]: 0.85
 Nummer der Bohrung: 3 Anzahl der Meßschritte: 30
 Vergleichsmeßreihenr.: 0 Datum: 18.07.24
 Meßreihenr.: 6 Datum: 21.01.26
 Lage des Festpunktes: unten Sondenlänge [m]: 1.0
 Bez. Für A+ Richtung: 260°
 Baugrund:

MESS- KABEL- MARKE	MESSINTERVALL TIEFE UNTER GOK VON (m) BIS	DIFFERENZ ZUR MEßREIHE: 0 A (cm) B	BEWEGUNGS- RATE (mm/Tag)
1.0	-0.10 0.90	0.4250 0.0450	0.00770
2.0	0.90 1.90	0.3050 -0.0050	0.00553
3.0	1.90 2.90	0.2900 0.0150	0.00525
4.0	2.90 3.90	0.2900 0.0200	0.00525
5.0	3.90 4.90	0.2600 0.0100	0.00471
6.0	4.90 5.90	0.1200 0.0300	0.00217
7.0	5.90 6.90	-0.0450 0.0550	0.00082
8.0	6.90 7.90	-0.0400 0.0350	0.00072
9.0	7.90 8.90	-0.0400 0.0300	0.00072
10.0	8.90 9.90	-0.0400 0.0300	0.00072
11.0	9.90 10.90	-0.0350 0.0300	0.00063
12.0	10.90 11.90	-0.0250 0.0250	0.00045
13.0	11.90 12.90	-0.0150 0.0250	0.00027
14.0	12.90 13.90	-0.0150 0.0250	0.00027
15.0	13.90 14.90	-0.0150 0.0250	0.00027
16.0	14.90 15.90	-0.0150 0.0150	0.00027
17.0	15.90 16.90	-0.0250 0.0150	0.00045
18.0	16.90 17.90	-0.0200 0.0100	0.00036
19.0	17.90 18.90	-0.0150 0.0050	0.00027
20.0	18.90 19.90	-0.0100 0.0150	0.00018
21.0	19.90 20.90	-0.0100 0.0150	0.00018
22.0	20.90 21.90	-0.0150 0.0150	0.00027
23.0	21.90 22.90	-0.0100 0.0050	0.00018
24.0	22.90 23.90	-0.0150 0.0100	0.00027
25.0	23.90 24.90	-0.0250 0.0100	0.00045
26.0	24.90 25.90	-0.0200 0.0400	0.00036
27.0	25.90 26.90	-0.0200 0.0350	0.00036
28.0	26.90 27.90	-0.0050 0.0350	0.00009
29.0	27.90 28.90	0.0300 0.0300	0.00054
30.0	28.90 29.90	0.0200 0.0200	0.00036

INKLINOMETERMESSUNG

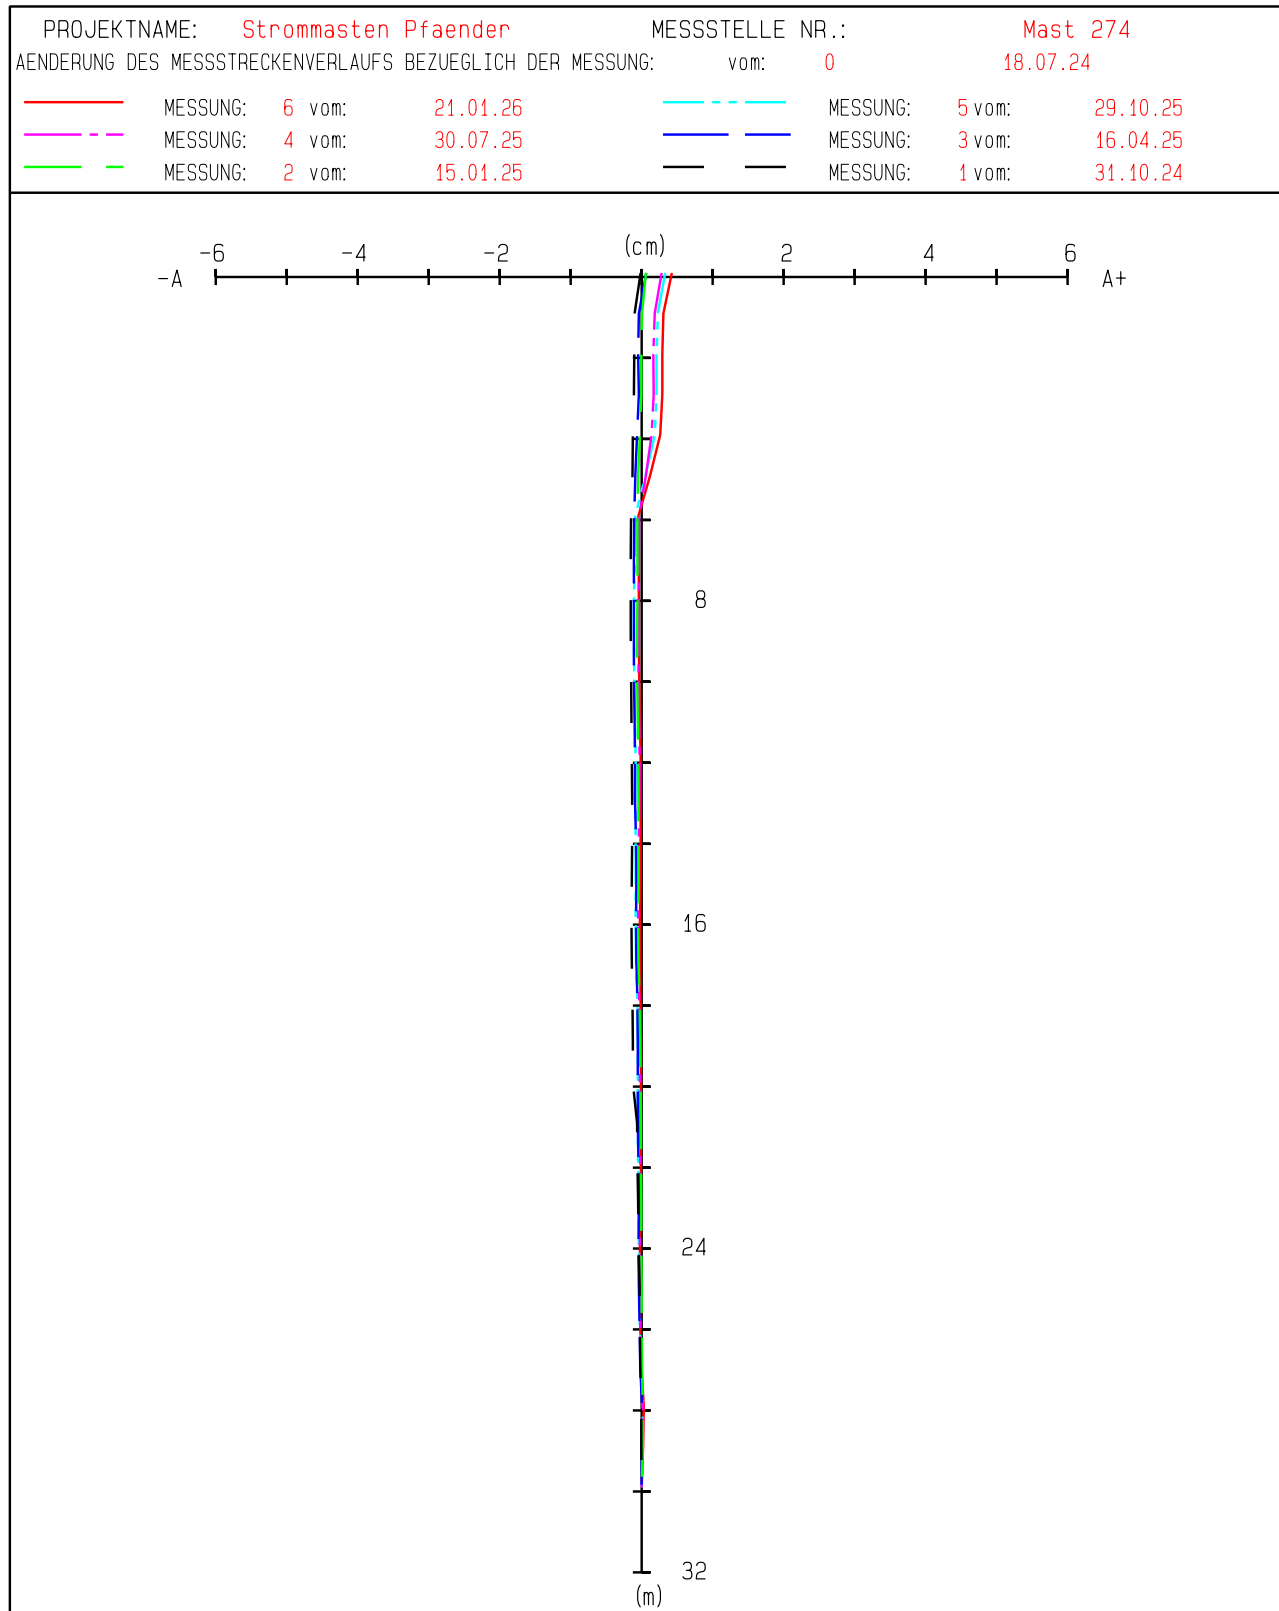

INKLINOMETERMESSUNG

